



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024


TESORERÍA
MUNICIPAL

"2024. Año del Bicentenario de la Erección
del Estado Libre y Soberano de México"

No. De OFICIO: TM/024/2024

Chalco, Méx. A 12 de Enero del 2024

LIC. JEANETTE VILLA ESCOBAR
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUB-SECRETARIA DE
PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .

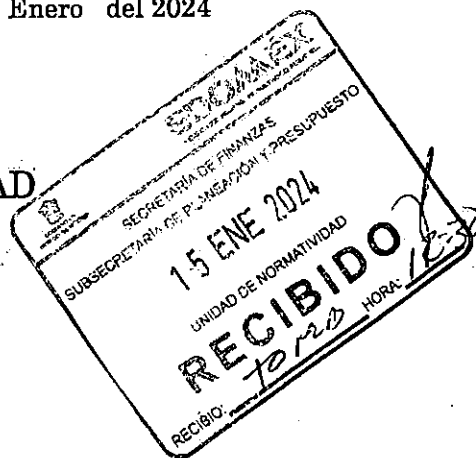

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 2023 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (FAISMUN) 2023 correspondiente al mes de Diciembre 2023

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



TESORERÍA
MUNICIPAL

M. en D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO




ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
60911/ 0001 9614	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PINO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2023-03-15	2023-05-31	3,672,871.32	3,672,871.32	0.00	3,672,871.32	3,672,871.32	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,510.00		2 COLONIA	1	1,250	100	100.00
60913/ 0002 9853	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	13,662,754.98	13,662,754.98	0.00	13,662,754.98	13,662,754.98	0.00	02 METRO C UADRAD O	7,990.00		2 COLONIA	1	2,600	100	100.00
60915/ 0003 10062	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PINO, / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	8,380,952.38	8,380,952.38	0.00	8,380,952.38	8,380,952.38	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,722.14		3 POBLAD O	1	3,800	100	100.00
60917/ 0004 10076	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	8,026,387.34	8,026,387.34	0.00	8,026,387.34	8,026,387.34	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,897.81		2 COLONIA	1	3,200	100	100.00
60920/ 0006 11156	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	14,758,120.32	14,758,120.32	0.00	14,758,120.32	14,758,120.32	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,360.00		2 COLONIA	1	2,600	100	100.00
60922/ 0007 11411	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SERIS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	9,099,118.58	9,099,118.58	0.00	9,099,118.58	9,099,118.58	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,510.44		2 COLONIA	1	5,200	100	100.00
60923/ 0008 11424	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DALIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	8,017,000.46	8,017,000.46	0.00	8,017,000.46	8,017,000.46	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,680.00		2 COLONIA	1	3,200	100	100.00
60926/ 0009 11494	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS, / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	5,682,870.82	5,682,870.82	0.00	5,682,870.82	5,682,870.82	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,953.70		3 POBLAD O	1	2,600	100	100.00
60928/ 0010 11499	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ENRIQUE ONTIVEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	4,488,113.16	4,488,113.16	0.00	4,488,113.16	4,488,113.16	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,538.84		3 POBLAD O	1	4,300	100	100.00
60930/ 0011 11525	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE NIÑOS HEROES, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2023-03-15	2023-03-31	6,873,943.85	6,873,943.85	0.00	6,873,943.85	6,873,943.85	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,367.48		3 POBLAD O	1	2,600	100	100.00
60931/ 0012 11534	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	4,033,951.55	4,033,951.55	0.00	4,033,951.55	4,033,951.55	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,680.00		2 COLONIA	1	2,500	100	100.00
60964/ 0015 16453	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	Construcción de techado en área de impartición de educación física, en Primaria Carlos Chavez, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	3,000,642.31	3,000,642.31	0.00	3,000,642.31	3,000,642.31	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 QUILÓMETROS	30	310	100	100.00

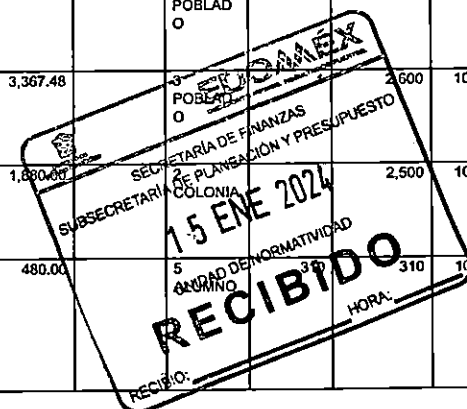



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Iniso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
60966/ 0016 16498	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	2,589,953.43	2,589,953.43	0.00	2,589,953.43	2,589,953.43	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		5 ALUMNO	180	180	100	100.00
60967/ 0017 16516	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR XOCHIPILLI / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	1,180,466.50	1,180,466.50	0.00	1,180,466.50	1,180,466.50	0.00	02 METRO CUADRO	400.00		5 ALUMNO	320	320	100	100.00
60969/ 0018 17097	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA No. 0371 JUAN RUIZ DE ALARCON, / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	2,099,900.90	2,099,900.90	0.00	2,099,900.90	2,099,900.90	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		5 ALUMNO	210	210	100	100.00
60971/ 0019 17147	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR ITZCOATL, / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	1,935,370.61	1,935,370.61	0.00	1,935,370.61	1,935,370.61	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
60972/ 0020 17155	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	2,104,288.23	2,104,288.23	0.00	2,104,288.23	2,104,288.23	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		5 ALUMNO	210	210	100	100.00
60973/ 0021 17196	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR SIMÓN CASTILLO MONTES, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	1,734,423.36	1,734,423.36	0.00	1,734,423.36	1,734,423.36	0.00	02 METRO CUADRO	400.00		5 ALUMNO	160	160	100	100.00
60975/ 0022 17210	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	2,468,553.51	2,468,553.51	0.00	2,468,553.51	2,468,553.51	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		5 ALUMNO	340	340	100	100.00
60977/ 0023 17221	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA TECNICA NO. 28 TELPOCHCALLI / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	3,301,913.06	3,301,913.06	0.00	3,301,913.06	3,301,913.06	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		5 ALUMNO	180	180	100	100.00
60980/ 0024 17240	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA OFICIAL NO.198 / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	3,297,158.68	3,297,158.68	0.00	3,297,158.68	3,297,158.68	0.00	02 METRO CUADRO	596.19		5 ALUMNO	350	350	100	100.00

EDOMEX

SECRETARIA DE AGUINALZAS

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOS


SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOS

15 ENE 2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

HORA:

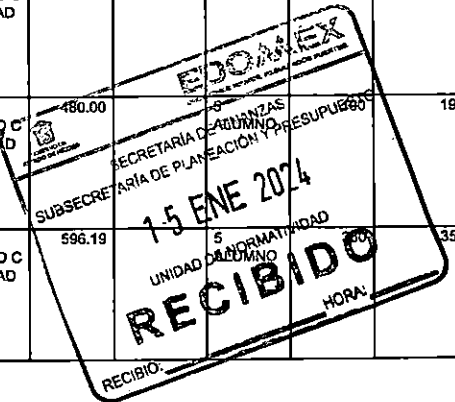



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
60981/ 0025 17302	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	2,817,553.35	2,817,553.35	0.00	2,817,553.35	2,817,553.35	0.00	02 METRO CUADRADOS	334.10		5 ALUMNO	220	220	100	100.00
60982/ 0026 17319	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	1,940,841.77	1,940,841.77	0.00	1,940,841.77	1,940,841.77	0.00	02 METRO CUADRADOS	480.00		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
61043/ 0028 17429	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207	PREPARATORIA (AULAS)	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	1,199,152.72	1,199,152.72	0.00	1,199,152.72	1,199,152.72	0.00	02 METRO CUADRADOS	96.00		5 ALUMNO	345	345	100	100.00
61047/ 0030 17495	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222	SECUNDARIA (AULAS)	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	564,980.00	564,980.00	0.00	564,980.00	564,980.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	480	480	100	100.00
61048/ 0031 17499	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	154	BIBLIOTECA	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	1,126,374.55	1,126,374.55	0.00	1,126,374.55	1,126,374.55	0.00	02 METRO CUADRADOS	152.36		5 ALUMNO	210	210	100	100.00
61049/ 0032 17957	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	293	SECUNDARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	915,401.32	915,401.32	0.00	915,401.32	915,401.32	0.00	02 METRO CUADRADOS	520.00		5 ALUMNO	290	290	100	100.00
61050/ 0033 18644	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	955,543.19	955,543.19	0.00	955,543.19	955,543.19	0.00	02 METRO CUADRADOS	301.98		5 ALUMNO	200	200	100	100.00
61185/ 0034 28374	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181	ELECTRIFICACION	CONTRATO	2023-04-15	2023-05-15	1,043,148.37	1,043,148.37	0.00	1,043,148.37	1,043,148.37	0.00	19 POSTE	11.00		2 COLONIA	1	246	100	100.00
61187/ 0035 28558	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181	ELECTRIFICACION	CONTRATO	2023-04-15	2023-05-15	1,245,676.57	1,245,676.57	0.00	1,245,676.57	1,245,676.57	0.00	19 POSTE	16.00		3 POBLADO	1	107	100	100.00
61417/ 0036 16384	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2023-03-30	2023-05-31	2,509,430.14	2,509,430.14	0.00	2,509,430.14	2,509,430.14	0.00	02 METRO CUADRADOS	480.00		5 ALUMNO	480	480	100	100.00
61418/ 0037 16465	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRATO	2023-03-31	2023-05-31	3,299,713.75	3,299,713.75	0.00	3,299,713.75	3,299,713.75	0.00	02 METRO CUADRADOS	480.00		5 ALUMNO	280	280	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61419/ 0038 16471	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. PREESCOLAR AMADO NERVO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-31	2023-05-31	2,089,687.18	2,089,687.18	0.00	2,089,687.18	2,089,687.18	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
61420/ 0039 17005	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-31	2023-05-31	2,353,466.84	2,353,466.84	0.00	2,353,466.84	2,353,466.84	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	380	380	100	100.00
61421/ 0040 18775	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-31	2023-05-31	774,496.75	774,496.75	0.00	774,496.75	774,496.75	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	280	280	100	100.00
61484/ 0041 14253	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANORIAS 2, / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	2,511,936.98	2,511,936.98	0.00	2,511,936.98	2,511,936.98	0.00	01 METRO LINEAL	1,313.66		3 POBLADO	1	2,600	100	100.00
61485/ 0042 14725	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHE GUEVARA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	1,976,485.82	1,976,485.82	0.00	1,976,485.82	1,976,485.82	0.00	01 METRO LINEAL	1,565.78		2 COLONIA	1	1,600	100	100.00
61488/ 0043 14908	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUCIO CABAÑAS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	2,084,009.68	2,084,009.68	0.00	2,084,009.68	2,084,009.68	0.00	02 METRO CUADRADO	1,612.80		2 COLONIA	1	1,800	100	100.00
61489/ 0044 15065	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JAZMÍN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	2,111,679.34	2,111,679.34	0.00	2,111,679.34	2,111,679.34	0.00	02 METRO CUADRADO	1,551.32		2 COLONIA	1	1,900	100	100.00
64887/ 0045 133894	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GARDENIA, BEGONIA, NOCHEBUENA, FLOR DE ALHELI EN ARBOLEDAS / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRATO	2023-08-15	2023-09-29	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	458.40		3 POBLADO	1	221	100	100.00
64888/ 0046 138279	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA No 3 DE SANTA MARIA HUEXOCULCO / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2023-08-16	2023-11-13	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	120.00		3 POBLADO	1	2,427	100	100.00
64889/ 0047 138175	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AMPLIACIÓN MORELOS EN SAN MARTIN CUAUTLALPAN / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2023-08-17	2023-09-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		3 POBLADO	1	181	100	100.00
65683/ 0049 189878	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEMBRILLO, / SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRATO	2023-07-01	2023-09-30	6,398,683.43	6,398,683.43	0.00	6,398,683.43	6,398,683.43	0.00	02 METRO CUADRADO	2,773.07		3 POBLADO	1	1,800	100	100.00
65685/ 0050 172814	17 URB	UR URBANIZACION	A REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	282 CENTROS CULTURALES Y/O ARTISTICOS	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2023-09-01	2023-11-30	5,145,654.90	5,145,654.90	0.00	5,145,654.90	5,145,654.90	0.00	02 METRO CUADRADO	1,616.56		3 POBLADO	1	1,800	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE NORMATIVIDAD


15 ENE 2024

RECIBIDO

1,000

100

100.00

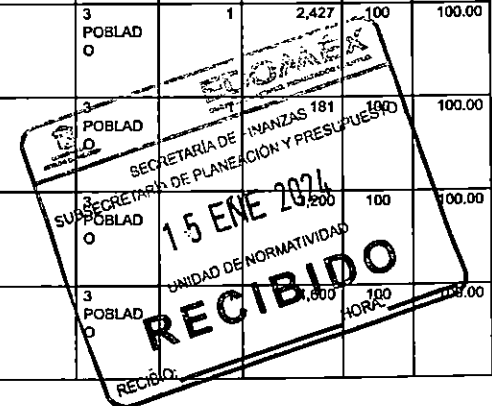



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO




ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Ffs.	Fin.
65686/ 0051 172550	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACI ON COMPLEMEN TARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-01	2023-10-31	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,184.57		2 COLONIA	1	8,900	100	100.00
66132/ 0052 229229	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCC ION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO 2 DE LA CANDELARIA TLAPALA PARA REFORZAR EL CENTRO DEL PUEBLO Y LA COLONIA JARDINES DE TLAPALA / CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRAT O	2023-08-14	2023-12-28	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	120.00		3 POBLAD O	1	2,356	100	100.00
66665/ 0053 93748	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	207 PREPARATORI A (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C, EN PREPARATORIA No. 312, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-09-30	1,722,200.92	1,722,200.92	0.00	1,722,200.92	1,722,200.92	0.00	02 METRO C UADRAD O	132.23		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
66668/ 0054 238311	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	564,847.52	564,847.52	0.00	564,847.52	564,847.52	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	467	467	100	100.00
66669/ 0055 238655	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR NEZAHUALPILLI, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	565,135.63	565,135.63	0.00	565,135.63	565,135.63	0.00	02 METRO C UADRAD O	74.88		5 ALUMNO	184	184	100	100.00
66670/ 0056 240258	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA MARGARITA MORÁN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-07-15	2023-10-30	278,501.11	278,501.11	0.00	278,501.11	278,501.11	0.00	02 METRO C UADRAD O	28.00		5 ALUMNO	304	304	100	100.00
66671/ 0057 240361	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN PRIMARIA MARGARITA MORÁN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	1,542,656.97	1,542,656.97	0.00	1,542,656.97	1,542,656.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	132.23		5 ALUMNO	304	304	100	100.00
66672/ 0058 240405	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ, CCT: 15EPRO138J, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	467,431.57	467,431.57	0.00	467,431.57	467,431.57	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	280	280	100	100.00
66678/ 0059 240561	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	293 SECUNDARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0698 JUANA DE ASBAJE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	1,175,172.35	1,175,172.35	0.00	1,175,172.35	1,175,172.35	0.00	02 METRO C UADRAD O	800.00		5 ALUMNO	360	360	100	100.00
66680/ 0060 240725	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA. EN PRIMARIA PEDRO LEÓN, / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	1,798,310.24	1,798,310.24	0.00	1,798,310.24	1,798,310.24	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		5 ALUMNO	325	325	100	100.00
66682/ 0061 240790	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	228 SECUNDARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	1,462,473.74	1,462,473.74	0.00	1,462,473.74	1,462,473.74	0.00	02 METRO C UADRAD O	48.00		5 ALUMNO	450	450	100	100.00
66683/ 0062 232783	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO U2C EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1054 ERNESTO GUEVARA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	768,828.67	768,828.67	0.00	768,828.67	768,828.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	87.28		5 ALUMNO	150	150	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO




ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67123/ 0063 268832	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: JADE, ESMERALDA Y DIAMANTE / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	1,328,512.10	1,328,512.10	0.00	1,328,512.10	1,328,512.10	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBLAD O	268	268	100	100.00
67125/ 0064 268908	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: CUNA DE MOISES, GIRASOLES Y ESTANISLAO CORTES / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	1,607,603.17	1,607,603.17	0.00	1,607,603.17	1,607,603.17	0.00	19 POSTE	17.00		3 POBLAD O	1	123	100	100.00
67127/ 0065 268983	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE: CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE: / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-31	509,022.09	509,022.09	0.00	509,022.09	509,022.09	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	45	100	100.00
67128/ 0066 289096	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE: PROL. REFORMA Y LA CUCHILLA / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	955,416.43	955,416.43	0.00	955,416.43	955,416.43	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBLAD O	1	90	100	100.00
67315/ 0067 289143	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE: PINO / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	1,107,935.95	1,107,935.95	0.00	1,107,935.95	1,107,935.95	0.00	19 POSTE	16.00		3 POBLAD O	1	86	100	100.00
67316/ 0068 290165	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: CDA. DE LAS FLORES Y CDA. ALDAMA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	1,187,157.86	1,187,157.86	0.00	1,187,157.86	1,187,157.86	0.00	19 POSTE	15.00		3 POBLAD O	1	123	100	100.00
67317/ 0069 290189	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: CDA. DE PINO Y CDA. DE ALCANFOR / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	706,091.34	706,091.34	0.00	706,091.34	706,091.34	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLAD O	1	60	100	100.00
67454/ 0070 340350	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAPANECAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-12-12	2023-12-30	1,748,000.00	1,748,000.00	0.00	1,748,000.00	1,748,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	330.90		2 COLONIA	1	987	100	100.00
67757/ 0071 363277	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA 9, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-15	1,593,688.65	1,593,688.65	0.00	1,593,688.65	1,593,688.65	0.00	02 METRO C UADRAD O	612.75		2 COLONIA	380	100	100.00	
67758/ 0072 425450	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS.	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN CALLE REFORMA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-15	1,852,934.78	1,852,934.78	0.00	1,852,934.78	1,852,934.78	0.00	02 METRO C UADRAD O	567.00		3 POBLAD O	1,000	100	100.00	
67759/ 0073 383045	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	188 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-15	440,304.25	440,304.25	0.00	440,304.25	440,304.25	0.00	02 METRO C UADRAD O	211.00		3 POBLAD O	800	100	100.00	
67760/ 0074 383554	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILIT ACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TIZAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-15	1,632,723.78	1,632,723.78	0.00	1,632,723.78	1,632,723.78	0.00	01 METRO LINEAL	212.18		2 COLONIA	100	100	100.00	

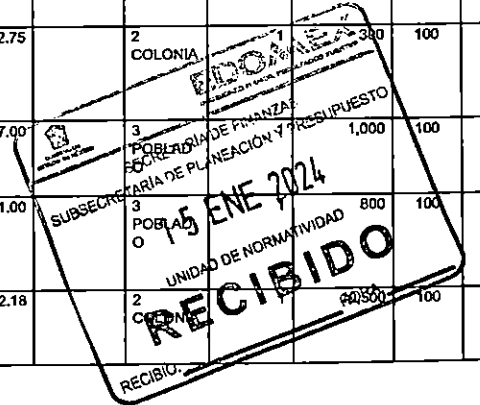



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67761/ 0075 384259	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA PEDRO LEÓN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-15	749,094.44	749,094.44	0.00	749,094.44	749,094.44	0.00	02 METRO C UADRAD O	765.00		5 ALUMNO	1	358	100	100.00
67762/ 0076 385155	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	291 PREESCOLAR (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCION DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-15	498,864.99	498,864.99	0.00	498,864.99	498,864.99	0.00	02 METRO C UADRAD O	710.00		5 ALUMNO	131	131	100	100.00
67763/ 0077 385224	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN PRIMARIA PROFA. MAL. PETRA ARREOLA ECHEVERRÍA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-15	2,410,934.62	2,410,934.62	0.00	2,410,934.62	2,410,934.62	0.00	02 METRO C UADRAD O	515.00		5 ALUMNO	434	434	100	100.00
67850/ 0078 395757	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-25	1,750,693.12	1,750,693.12	0.00	1,750,693.12	1,750,693.12	0.00	02 METRO C UADRAD O	357.00		5 ALUMNO	175	175	100	100.00
67852/ 0079 395905	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR RITA FERRINI RÍOS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-25	2,313,830.61	2,313,830.61	0.00	2,313,830.61	2,313,830.61	0.00	02 METRO C UADRAD O	399.00		5 ALUMNO	100	100	100	100.00
67853/ 0080 396072	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN PRIMARIA CARLOS FUENTES, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-25	2,096,108.16	2,096,108.16	0.00	2,096,108.16	2,096,108.16	0.00	02 METRO C UADRAD O	442.00		5 ALUMNO	471	471	100	100.00
67856/ 0081 396146	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBT No2 ANGEL MARIA GARIBAY KINTANA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-25	2,501,329.66	2,501,329.66	0.00	2,501,329.66	2,501,329.66	0.00	02 METRO C UADRAD O	513.00		5 ALUMNO	425	425	100	100.00
67857/ 0082 402677	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECT RIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIO BÁSICO AGUA PARA LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-25	231,467.70	231,467.70	0.00	231,467.70	231,467.70	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	388	388	100	100.00
67863/ 0083 403077	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	209 PREPARATORIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECT RIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIO BÁSICO AGUA PARA LA ESCUELA PREPARATORIA No. 312, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-15	224,534.80	224,534.80	0.00	224,534.80	224,534.80	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	100	100	100	100.00
67965/ 0084 403493	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRAT O	2023-11-15	2023-12-25	565,137.20	565,137.20	0.00	565,137.20	565,137.20	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	174	174	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Insgo	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67966/ 0085 425305	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN CBT NO.4, / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2023-11-15	2023-12-26	1,079,977.89	1,079,977.89	0.00	1,079,977.89	1,079,977.89	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	426	426,100	100	100.00
68074/ 0086 435317	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA 8, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-12-11	2023-12-22	1,681,778.16	1,681,778.16	0.00	1,681,778.16	1,681,778.16	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	650.00		2 COLONIA	1	1,800	100	100.00
68078/ 0087 435501	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MULTIDEPORTIVO DE TEZOMPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2023-12-11	2023-12-22	442,481.12	442,481.12	0.00	442,481.12	442,481.12	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	2,600	100	100.00
68081/ 0088 435635	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2023-12-11	2023-12-22	930,183.67	817,295.41	112,888.26	930,183.67	817,295.41	112,888.26	02 METRO CUADRADO	512.00		3 POBLADO	1	360	100	100.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 82							TOTAL		223,316,037.26	223,203,149.00	112,888.26	223,316,037.26	223,203,149.00	112,888.26								8200
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	------

Complementarios: 25 Directa: 57

GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
CIUDADANO JOSÉ MIGUEL
GUTIERREZ-MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

Maria del Angel Hernandez
MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024
JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CHALCO





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 356,613,035.10 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61196/0001	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NARANJO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-07-20	4,575,004.06	4,575,004.06	0.00	4,575,004.06	4,575,004.06	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	2,035.32		2 COLONIA	2,200	2,200	100	100.00
61197/0002	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NORTE 15 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-07-20	5,227,033.13	5,227,033.13	0.00	5,227,033.13	5,227,033.13	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	2,496.00		2 COLONIA	1	2,800	100	100.00
61198/0003	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HORTALIZAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	2,924,902.02	2,924,902.02	0.00	2,924,902.02	2,924,902.02	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1,279.29		3 POBLADO	1	2,600	100	100.00
61201/0004	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PONIENTE, / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-20	3,234,593.94	3,234,593.94	0.00	3,234,593.94	3,234,593.94	0.00	02 METRO CUADRADO	1,981.57		3 POBLADO	1	2,100	100	100.00
61221/0005	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LAS ROSAS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	14,457,051.37	14,457,051.37	0.00	14,457,051.37	14,457,051.37	0.00	02 METRO CUADRADO	9,910.00		2 COLONIA	1	3,200	100	100.00
61223/0006	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO AL PANTEON, / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	4,199,998.54	4,199,998.54	0.00	4,199,998.54	4,199,998.54	0.00	02 METRO CUADRADO	5,200.00		3 POBLADO	1	1,100	100	100.00
61224/0007	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	11,211,950.24	11,211,950.24	0.00	11,211,950.24	11,211,950.24	0.00	02 METRO CUADRADO	4,600.00		2 COLONIA	1	3,300	100	100.00
62339/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-16	2023-12-31	103,478,743.00	103,478,743.00	0.00	64,626,244.00	64,626,244.00	0.00	80 ELEMENTO	394.00		4 MUNICIPIO	41	394	62	62.46
62341/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-16	2023-12-31	13,781,473.60	13,781,473.60	0.00	13,781,473.60	13,781,473.60	0.00	50 EQUIPO	50.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
62342/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	2,582,390.17	2,582,390.17	0.00	2,582,390.17	2,582,390.17	0.00	34 VEHICULO	80.00		4 MUNICIPIO	1	80	100	100.00
62343/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	2,782,179.33	2,782,179.33	0.00	2,782,179.33	2,782,179.33	0.00	80 ELEMENTO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	100.00
62344/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	EVALUACIONES DE CENRO DE CONTROL Y CONFIANZA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00
62345/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	8,085,292.80	8,085,292.80	0.00	8,085,292.80	8,085,292.80	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS 394

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 ENE 2024

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

HORA:





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE

MÉXICO

¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 356,613,035.10 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
62346/ 0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE ANTIDOPING Y ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2023-03-16	2023-12-31	330,600.00	330,600.00	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00	20 ESTUDIO	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	100	100.00
62347/ 0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIE NTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE RADIOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2023-03-16	2023-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	168,415.36	168,415.36	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	9	6.74
62349/ 0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	114 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2023-03-16	2023-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	0	0.00
62362/ 0017	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIE NTO	038 EQUIPAMIENT O DE OFICINAS	COMPRA DE TERRENOS (PLAZA TLAPALA,CAMPO DE BEIS) / CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRAT O	2023-03-16	2023-12-31	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	25	100.00
62363/ 0018	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2023-03-16	2023-12-31	33,182,969.78	33,182,969.78	0.00	33,182,969.78	33,182,969.78	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00
62364/ 0019	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2023-03-16	2023-12-31	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,396,559.91	5,396,559.91	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	67	67.46
62942/ 0020	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	I EQUIPAMIE NTO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PARA CLINICA CHALCO (APOYO DIF) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2023-03-16	2023-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00
67830/ 0021	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIE NTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-23	2023-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,999,503.92	9,999,503.92	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00
68214/ 0022	03 ASH	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION	089 UNIDADES DEPORTIVAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO, / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRAT O	2023-12-01	2023-12-25	1,743,380.07	1,743,380.07	0.00	1,743,380.07	1,743,380.07	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,666.00		3 POBLAD O	1	3,500	100	100.00
68215/ 0023	03 ASH	EL ELECTRIFI CACION	A CONSTRUCC ION	034 ELECTRIFI CACION URBANA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA EN RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA CONVERSIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA Y OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA PARA LA CONEXIÓN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-12-01	2023-12-25	2,401,044.00	2,401,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPI O	1	1,500	0	0.00
68216/ 0024	03 ASH	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION	059 PAVIMENT ACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HERNÁN CORTÉS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-12-13	2023-12-26	15,785,433.42	15,785,433.42	0.00	15,782,358.69	15,782,358.69	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,244.50		2 POBLAD O	10,000	100	99.98	
68217/ 0025	03 ASH	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION	059 PAVIMENT ACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-12-13	2023-12-26	18,777,260.11	18,777,260.11	0.00	18,777,152.36	18,777,152.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,800.00		2 COLONIA	2,800	100	100.00	


SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANTACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO

15 ENE 2024

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
COLONIA

HORA:





Gobierno del
Estado de
México



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 356,613,035.10 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

CONSTITUCIONAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 356,613,035.10 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
68218/0028	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA. / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-26	10,662,742.93	10,662,742.93	0.00	10,660,572.80	10,660,572.80	0.00	02 METRO CUADRO	5,100.00		3 POBLADO	1	290	100	99.98
68219/0027	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JUAN DE DIOS. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-26	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	15,999,168.90	15,999,168.90	0.00	02 METRO CUADRO	5,100.00		2 COLONIA	1	2,800	100	99.99
68220/0028	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RICARDO CALVA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-26	2,714,800.00	2,714,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	842.17		2 COLONIA	1	2,800	0	0.00
68271/0029	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITA MORAN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-26	2,898,000.00	2,898,000.00	0.00	2,847,116.71	2,847,116.71	0.00	02 METRO CUADRO	896.00		2 COLONIA	1	2,600	100	98.24
68273/0030	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEROS	ADQUISICION DE QUIJADA DE LA VIDA PARA EL AREA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-16	2023-12-31	844,763.04	844,763.04	0.00	844,763.04	844,763.04	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
68311/0031	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA Y OBRA CIVIL PARA LA REUBICACION DE POSTES Y MODIFICACION DE RED DE MEDIA TENSION. / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-26	948,006.86	948,006.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	2,800	0	0.00
68312/0032	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS GLORIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-26	6,367,357.73	6,367,357.73	0.00	6,366,003.72	6,366,003.72	0.00	02 METRO CUADRO	2,244.00		2 COLONIA	1	1,500	100	99.98
68360/0033	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA MUNICIPIO DE CHALCO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-16	2023-12-31	4,676,436.00	4,676,436.00	0.00	4,676,436.00	4,676,436.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	100	100.00	
68361/0034	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA ORGANISMO ODAPAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-16	2023-12-31	4,659,684.00	4,659,684.00	0.00	4,659,684.00	4,659,684.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	100	100.00	
68362/0035	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE CREDITOS BANOBRAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 35									TOTAL	352,533,090.14	352,533,090.14	0.00	298,122,798.66	298,122,798.66	0.00							2733

Complementarios: 0

Directa: 0



PRESIDENCIA

Ciudadano JOSÉ MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MARIA DE ANGELES
HERNANDEZ CASTAÑEDA
SECRETARÍA MUNICIPAL



MARIO RODEA MAYORGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PÚBLICA



JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
